



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

51. Sitzung der Asse2 Begleitgruppe am 11.08.2017 in Wolfenbüttel

Dirk Laske

Vorgehensweise Rückholungsplanung



BUNDEGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

➤ Rückholungsplanung für die:

511-m-Sohle


- ELK 8a/511 (MAW)

725-m-Sohle

- ELK 7/725 Na2

750-m-Sohle

- 7 ELK in Kammergruppe Süd
- 3 ELK in Kammergruppe Ost
- 1 ELK in Kammergruppe Zentral (Na2)

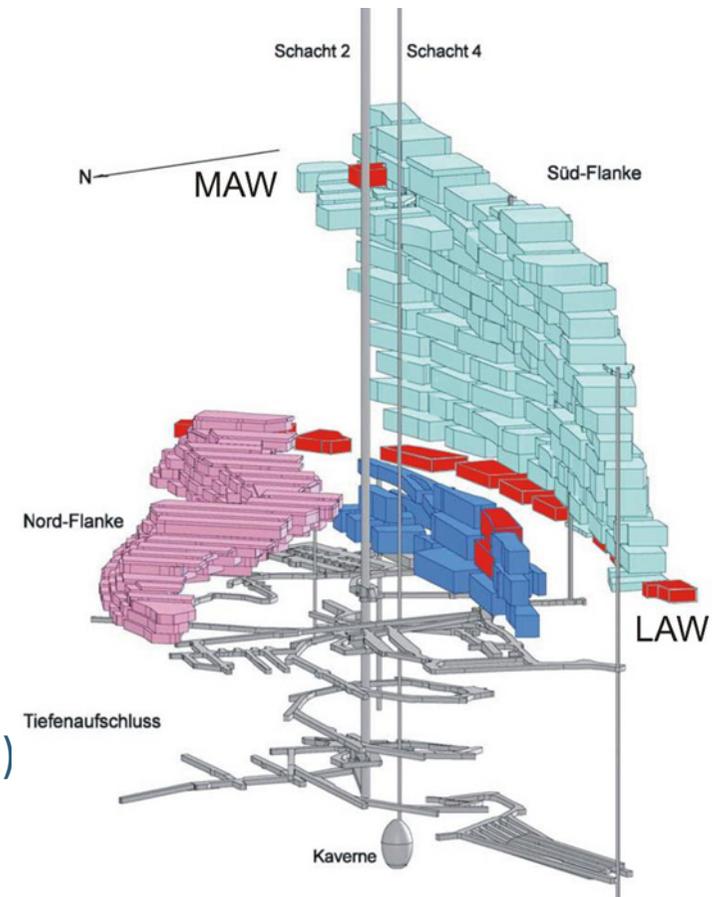


 : Einlagerungskammer (ELK)

Vorgehensweise Rückholungsplanung



BUNDEGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

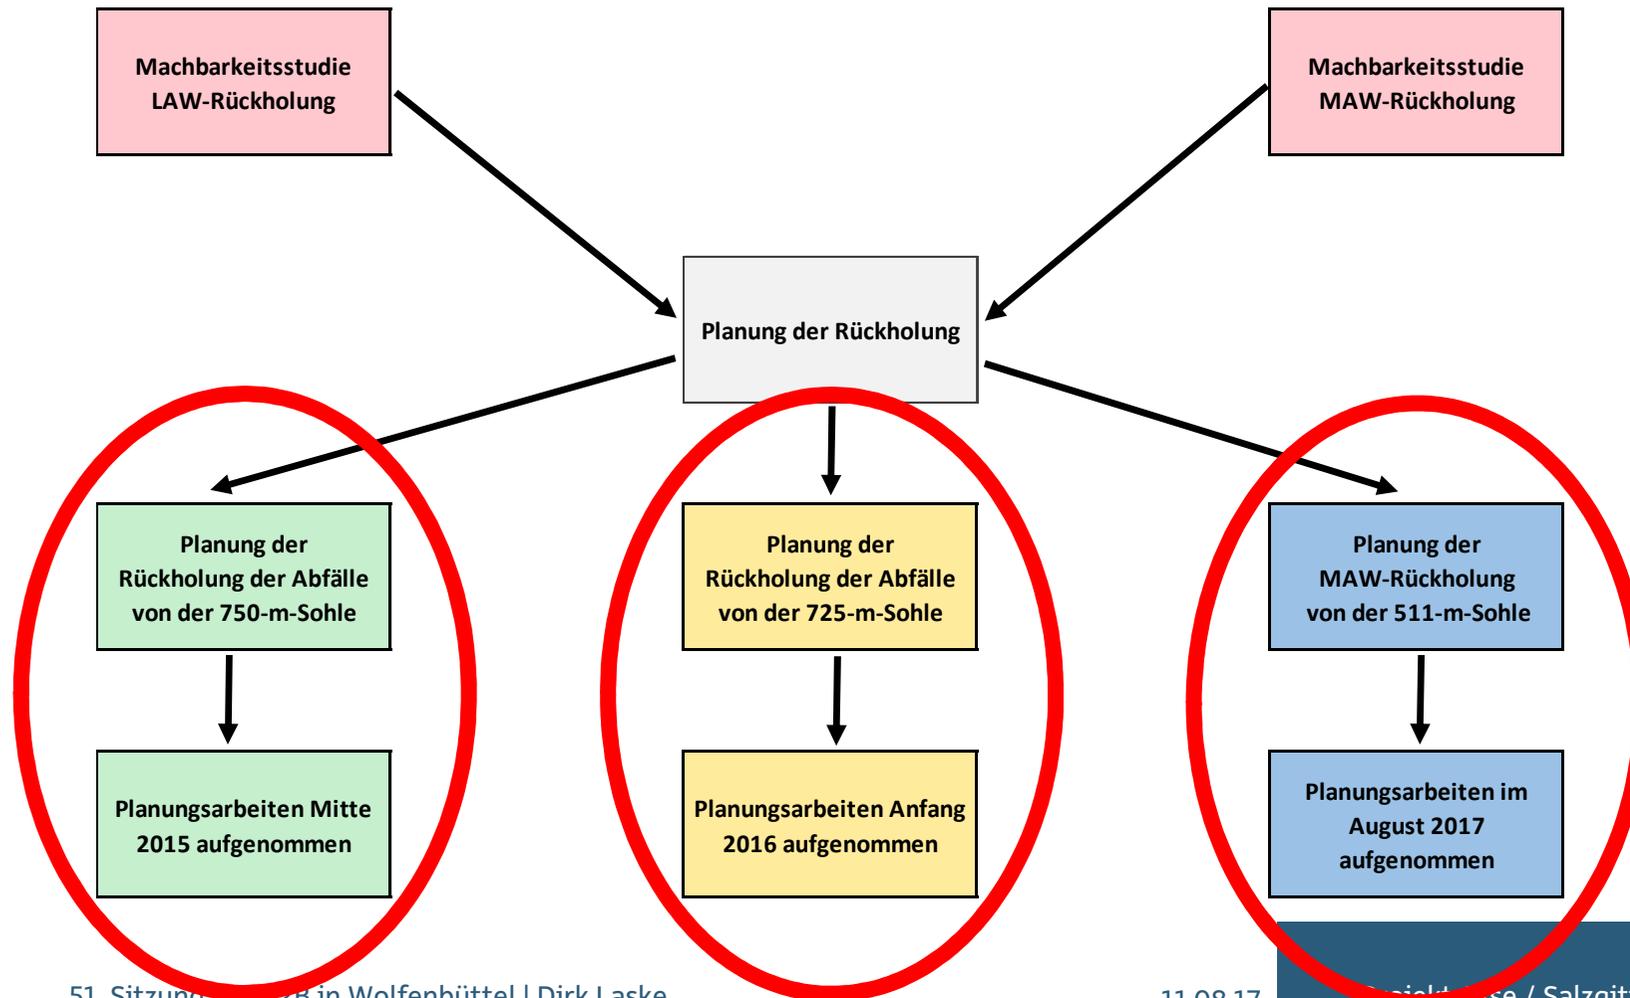

Auftragnehmer für Rückholungsplanung: MAW-Abfälle von der 511-m-Sohle



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

- DMT GmbH & Co. KG aus Essen



Mit den Unterauftragnehmern:

- ANT Applied New Technologies AG
- K-UTEC AG Salt Technologie
- Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH



Auftragnehmer für Rückholungsplanung: Abfälle von der 725-/750-m-Sohle



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG

- Planungs-Arbeitsgemeinschaft (Arge KR)
mit den Arge-Partnern:

- Uniper Anlagenservice GmbH



- Deilmann-Haniel GmbH




- Ercosplan Ingenieurgesellschaft
Geotechnik und Bergbau mbH



- TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

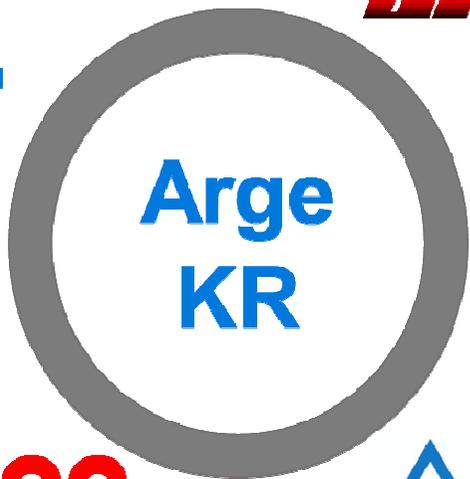

The logo for uniper, with 'uni' stacked above 'per' in a blue, lowercase, sans-serif font.The logo for DEILMANN-HANIEL, featuring a stylized red and black 'DH' symbol followed by the company name in a bold, black, uppercase font.A large, thick grey circle containing the text 'Arge' stacked above 'KR' in a blue, sans-serif font.The logo for ERCOSPLAN, with the word in a bold, red, uppercase, sans-serif font.

TÜVRheinland[®]
Genau. Richtig.



Rückholungsplanung 511-m-Sohle (MAW)

- Vorstellung des technischen Konzepts 08/2018
- Abschluss der Konzeptplanung 02/2019

Rückholungsplanung 725-m-Sohle (vorgezogene Rückholung)

- Vorstellung des technischen Konzepts 12/2017
- Abschluss der Konzeptplanung 04/2018



Rückholungsplanung 750-m-Sohle

- | | |
|--|---------|
| ▪ Vorstellung der technischen Konzepte | 03/2018 |
| ▪ Festlegung der Vorzugsvarianten | 04/2018 |
| ▪ Abschluss der Konzeptplanung | 04/2019 |

